

## 1. VALOR GANADO

En este apartado, se procede a realizar un análisis de las horas invertidas en la planificación del proyecto con la finalidad de extraer la desviación entre los recursos planificados y dedicados en la etapa previa a la implantación del proyecto.

Así, se han realizado dos tipos de análisis:

- Recursos previstos vs Recursos reales
- Hitos previstos vs Hitos reales

		HORAS REALES	ACUMULADO REAL	HORAS PREVISTAS	ACUMULADO PREVISTO	SEMANA REAL	SEMANA PREVISTA	DANIEL	VALENTÍ	SOLEDAD
Satélites	Diseñar página web	13	13	10	10	15	15		22/04/2018	22/04/2018
	Proyecto Académico	14	27	15	25	15	15			21/04/2018
Inicio del Proyecto	Crear Acta de Constitución del Proyecto	6	33	5	30	16	17	21/04/2018	21/04/2018	
	Identificar los interesados del Proyecto	12	45	10	40	17	17	26/04/2018	26/04/2018	
Alcance	Plan de gestión del Alcance	1	46	1,5	41,5	19	20		07/05/2018	28/04/2018
	Plan de gestión de los Interesados	4	50	4	45,5	19	20	07/05/2018		
	Recopilar Requisitos	10	60	8	53,5	18	20		05/05/2018	05/05/2018
	Definir el Alcance	3	63	3	56,5	19	20	08/05/2018	08/05/2018	
	Crear la EDT/WBS	12	75	10	66,5	19	20	08/05/2018	08/05/2018	
	Diccionario EDT	6	81	8	74,5	19	20			13/05/2018
	Validar el Alcance	2	83	2	76,5	19	20	08/05/2018	08/05/2018	
	Controlar el Alcance	1	84	1	77,5	19	20		09/05/2018	
Tiempo	Plan de gestión del tiempo	3	87	3	80,5	19	22	12/05/2018	12/05/2018	12/05/2018
	Definir las actividades	18	105	20	101	20	22	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018
	Secuenciar actividades	12	117	8	109	22	22	03/06/2018	03/06/2018	03/06/2018
	Estimar los recursos de las actividades	4	121	4	113	23	22	04/06/2018		

	Estimar la duración de las actividades	2	123	3	116	23	22	04/06/2018	05/06/2018	
	Desarrollar el Cronograma	3	126	4	120	23	22	05/06/2018	05/06/2018	
	Controlar el cronograma	2	128	2	122	23	22			06/06/2018
Costes	Plan de gestión de los Costes	2	130	2	124	23	24			08/06/2018
	Estimar los Costes	7	137	8	132	23	24		08/06/2018	
	Establecer el Presupuesto	4	141	4	136	23	24	10/06/2018	10/06/2018	
	Controlar los Costes	3	144	2	138	24	24	11/06/2018		
Calidad	Plan de gestión de la Calidad	1	145	1	139	24	25			12/06/2018
	Gestión de la calidad	10	155	8	147	24	25	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018
	Controlar la Calidad	1	156	1	148	24	25			15/06/2018
Recursos Humanos	Plan de Gestión de los Recursos Humanos	6	162	6	154	24	25		16/06/2018	16/06/2018
Comunicación	Plan de gestión de las comunicaciones	8	170	6	160	25	25	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018
	Controlar las comunicaciones	2	172	2	162	25	25			18/06/2018
Riesgos	Plan de Gestión de los Riesgos	1	173	1	163	25	26			19/06/2018
	Identificación de los Riesgos	10	183	12	175	25	26	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018
	Realizar el análisis cualitativo	18	201	20	195	25	26	21/06/2018	21/06/2018	
	Realizar el análisis cuantitativo	12	213	10	205	25	26	23/06/2018	23/06/2018	
	Planificar las respuestas	20	233	20	225	25	26	24/06/2018	24/06/2018	24/06/2018
	Controlar los riesgos	2	235	2	227	26	26			25/06/2018
Lecciones aprendidas	Lecciones aprendidas	6	241	6	233	26	26	30/06/2018	30/06/2018	30/06/2018
Actas	Acta 1	0,5	242	0,5	233					24/03/2018
	Acta 2	0,5	242	0,5	234					06/04/2018
	Acta 3	0,5	243	0,5	234					13/04/2018
	Acta 4	0,5	243	0,5	235					21/04/2018
	Acta 5	0,5	244	0,5	235					25/04/2018
	Acta 6	0,5	244	0,5	236					07/05/2018
	Acta 7	0,5	245	0,5	236					13/05/2018
	Acta 8	0,5	245	0,5	237					17/05/2018
	Acta 9	0,5	246	0,5	237					03/06/2018
	Acta 10	0,5	246	0,5	238					12/06/2018

TOTAL

246

238

Con la finalidad de hacer más visual éste análisis, se procede con la realización de las siguientes gráficas, expresando los análisis comentados anteriormente:



Ilustración 8: Valor Ganado Hitos

Fuente: propia

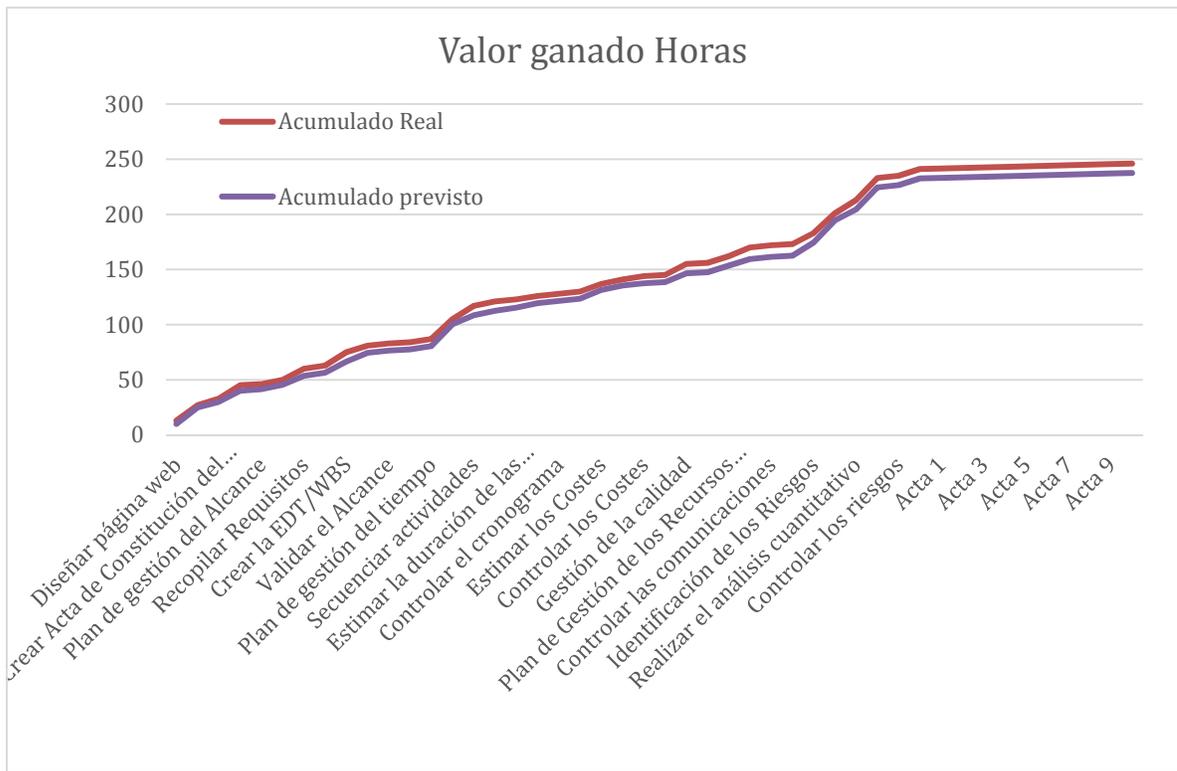


Ilustración 9: Valor Ganado Horas

Fuente: propia
